PROVINCIA DI IMPERIA
Prot. n. 0023089 29 MAG 2015
Otg.02 Fas.06 Cl.11 [redacted]

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria

ALLEGATO

Fondi ARCUS 2010-12

Committente e Stazione Appaltante: Provincia di Imperia
Direzione Regionale BCP Liguria - Soprintendenza BA Liguria
In collaborazione col Comune di Ventimiglia

RESTAURO, RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO ROMANO DI VENTIMIGLIA

II° STRALCIO

ELABORATO L2

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Dirigente responsabile
Dr.ssa Lucia Baudo (Provincia di Imperia)

Responsabile unico del procedimento
Ing. Enrico Lauretti (Provincia di Imperia)

Progettista
Arch. Domenico Podestà - Salita San Matteo 19 int. 21a – Genova

Co-Progettisti
Arch. Luisa De Marco (Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria)

Dr. Luigi Gambaro (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria)

Collaboratori alla progettazione
Collaboratori alla progettazione architettonica: Maria Podestà - Arch. Cinzia Mazzini
Collaboratore alla progettazione strutturale: Arch. Giuditta Parodi
Collaboratore alla progettazione impiantistica: Ing. Claudio Gianì

Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione
Ing. Paolo Rovere – via F.R. Carli 9/1 – Imperia
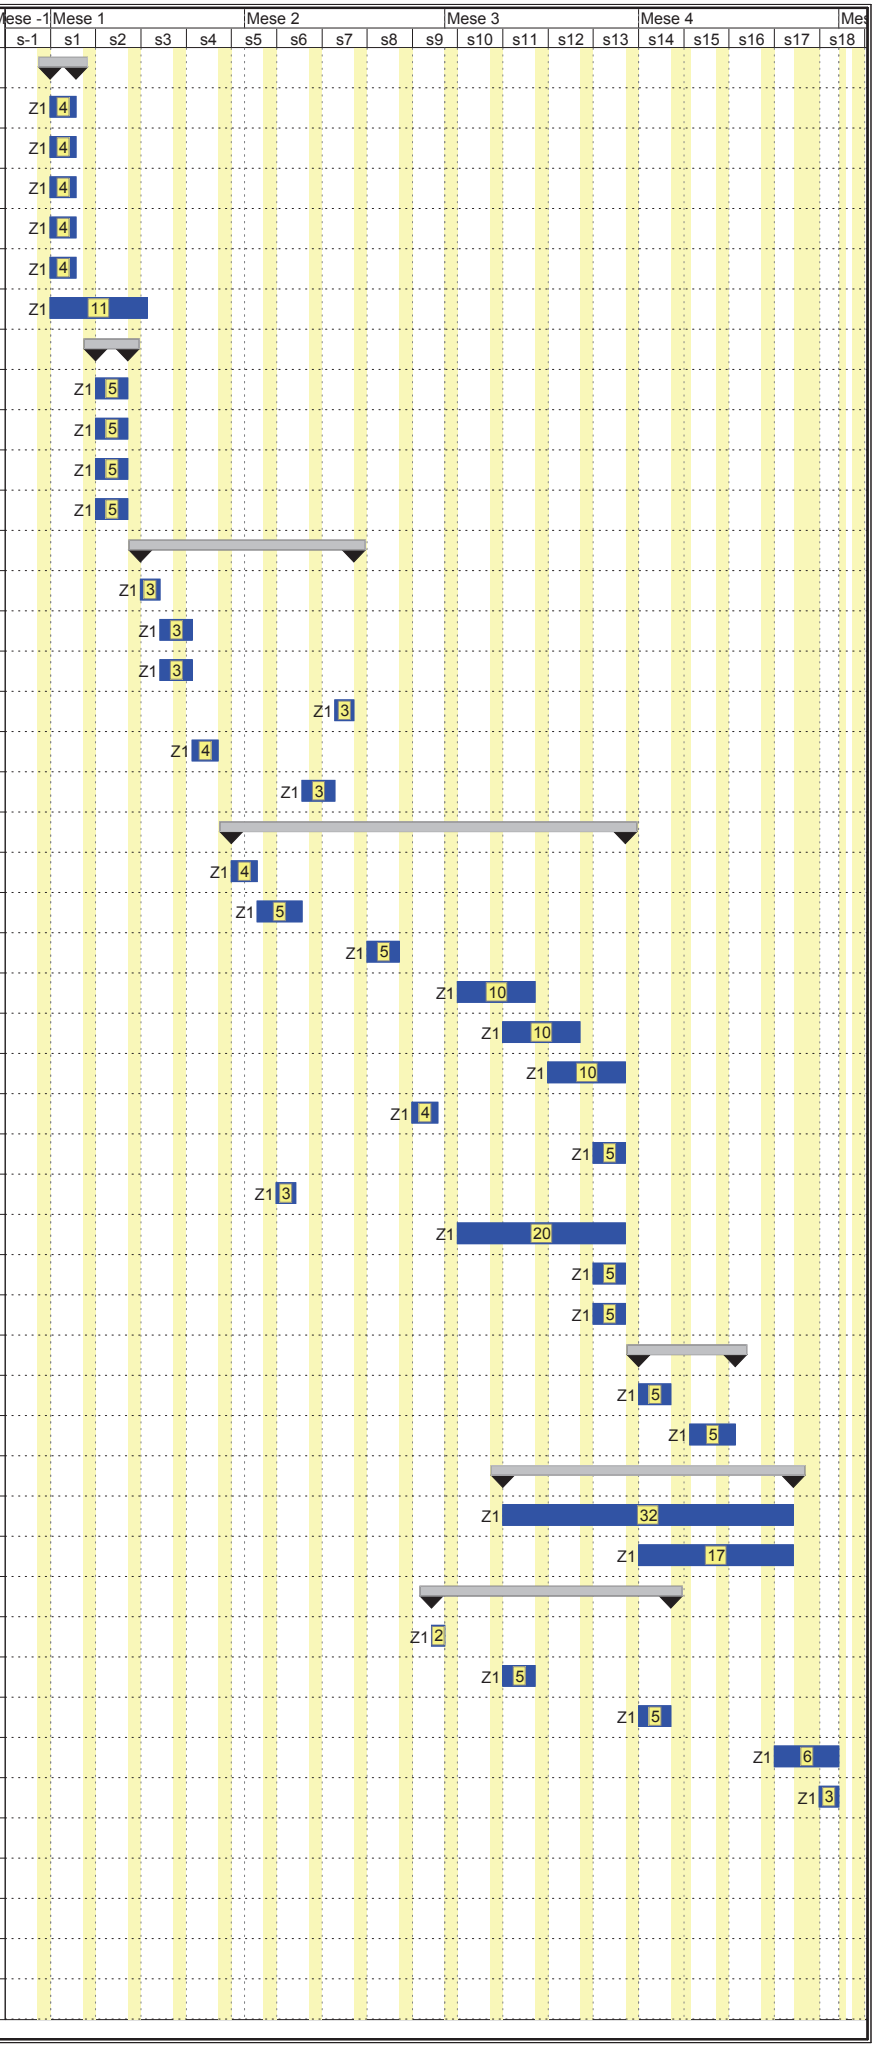
Nome attività	Durata
Allestimento del cantiere	4 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	4 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	4 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	4 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	4 g
Montaggio e smontaggio della gru a torre (CME 6 - 7)	4 g
Montaggio ponteggi e protezioni	11 g
Demolizioni (CME 1 - 5)	5 g
Rimozione di Tavolato Ligneo	5 g
Demolizione generale di strutture in c.a. e non armato	5 g
Demolizione generale di murature di pietrame o mattoni pieni	5 g
Smontaggio di manufatti in ferro o acciaio	5 g
Nuova recinzione su piazzale (CME 8 - 16)	25 g
Scavo a sezione ristretta	3 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	3 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi	3 g
Realizzazione rete metallica	3 g
Montaggio cancello metallico	4 g
Realizzazione strutture metalliche (ringhiere, cancellate, etc.)	3 g
Opere Metalliche (CME 17 - 78 e 82 - 83)	45 g
Scavo a sezione obbligata (CME 76)	4 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (CME 77 -	5 g
Posa ringhiere interne all'area del teatro	5 g
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	10 g
Montaggio di strutture reticolari in acciaio	10 g
Montaggio di strutture verticali in acciaio	10 g
Posa ringhiera rampa carrabile accesso piazzale (CME 57-58	4 g
Realizzazione Struttura Lapidariumi (CME 60-61-62-63-64-65	5 g
Montaggio cancello d'ingresso (CME 72-73-74-75)	3 g
Completamento sedute (CME - 79)	20 g
Realizzazione Piattaforma Elevatrice (CME - 80)	5 g
Realizzazione di barriera automatica (CME - 81)	5 g
Pavimentazione Piazzale (CME 84 - 88)	10 g
Asportazione pavimentazione stradale	5 g
Formazione nuovo strato pavimentazione	5 g
Opere Impiantistiche (CME - 89 - 151)	32 g
Realizzazione di impianto elettrico	32 g
Realizzazione impianto antincendio	17 g
Economie (CME 152)	27 g
Consolidamento cancello Corso Genova	2 g
Movimentazione blocchi	5 g
Manutenzione rampa carrabile	5 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	6 g
Smobilizzo del cantiere	3 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA
